



Product Strategy Canvas

Rédacteur	Yoann DE CLER	Date	Octobre 2025	Nom du client	Sophie, Cheffe de projet au sein du service Project Management Office de Sanitorial
------------------	---------------	-------------	--------------	----------------------	---

Veuillez-vous appuyer sur la note de cadrage de la mission pour remplir le tableau ci-dessous.

Nom du tableau de bord :		Objectif du dashboard : Evaluer la performance des différents projets pour IT et Marketing		
Utilisateurs	Stories			
Directeur Général	User story 1 En tant que Directeur Général, je veux visualiser la performance globale du coût de tous les projets afin de suivre et piloter l'activité	User story 2 En tant que Directeur Général, je veux visualiser la performance globale du respect des deadlines de tous les projets afin de suivre et piloter l'activité	User story 3 En tant que Directeur Général, je veux visualiser la performance globale des livrables produit par rapport au planning de tous les projets afin de suivre et piloter l'activité	User story 4 En tant que Directeur Général, je veux visualiser les écarts de performance significatifs (>= 15%) afin de décider de la poursuite ou non de ce projet

Directeur Régional	User story 5 En tant que Directeur Régional, je veux visualiser la performance globale du coût de tous les projets de ma région afin de suivre et piloter l'activité	User story 6 En tant que Directeur Régional, je veux visualiser la performance globale du respect des deadlines de tous les projets de ma région afin de suivre et piloter l'activité	User story 7 En tant que Directeur Régional, je veux visualiser la performance globale des livrables produit par rapport au planning de tous les projets de ma région afin de suivre et piloter l'activité	User story 8 En tant que Directeur Régional, je veux visualiser les écarts de performances des projets ($\geq 15\%$) de ma région afin d'intervenir auprès de directeurs de pays
Directeur de pays	User story 9 En tant que Directeur de Pays, je veux visualiser les performances coût des projets de mon pays afin de prendre des mesures correctives si besoin	User story 10 En tant que Directeur de Pays, je veux visualiser les deadlines des projets de mon pays afin de prendre des mesures correctives si besoin	User story 11 En tant que Directeur de Pays, je veux visualiser les performances livrables produit par rapport au planning des projets de mon pays afin de prendre des mesures correctives si besoin	

Préparation des données

Nom						
Projects_plans						
Toutes les propriétés						
ÉTAPES APPLIQUÉES						
Source						
Navigation						
En-têtes promus						
Type modifié						
Colonnes renommées						
Premières lignes supprimées						
Type modifié1						
Lignes filtrées						
Lignes vides supprimées						
Colonne fusionnée insérée						
Colonnes renommées1						
Texte inséré avant le délimiteur						
X Colonnes renommées2						
A ^B _C Project ID						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 104 distinct(s), 0 unique(s)						
A ^B _C Phase						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 10 distinct(s), 0 unique(s)						
Start Date						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 423 distinct(s), 340 unique(s)						
1 ² ₃ Planned_Duration						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 187 distinct(s), 43 unique(s)						
1 ² ₃ Planned_Cost						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 59 distinct(s), 24 unique(s)						
1 ² ₃ Planned_De						
Valide 100 % Erreur 0 % Vide 0 % 32 distinct(s), 0 unique(s)						
1	1	Phase 1 - Planning	16/01/2018	196	50000	
2	1	Phase 2 - Initiation	31/01/2018	15	100000	
3	1	Phase 3 - Implementation	17/04/2018	197	150000	
4	1	Phase 4 - Manufacturing	10/10/2018	61	450000	
5	2	Phase 1 - Planning	30/01/2018	16	100000	
6	2	Phase 2 - Initiation	01/04/2018	109	200000	
7	2	Phase 3 - Implementation	06/06/2018	146	300000	
8	2	Phase 4 - Manufacturing	18/08/2018	94	900000	
9	3	Phase 1 - Planning	03/03/2018	91	50000	
10	3	Phase 2 - Initiation	25/03/2018	77	100000	
11	3	Phase 3 - Implementation	28/04/2018	169	150000	
12	3	Phase 4 - Manufacturing	23/10/2018	61	450000	
13	4	Phase 1 - Planning	02/04/2018	31	50000	
14	4	Phase 2 - Initiation	21/09/2018	13	100000	
15						

Modèle relationnel



GUIDE D'UTILISATION

Ce dashboard a été conçu pour offrir une vision synthétique et dynamique de l'état d'avancement de vos projets. Il permet d'analyser les **coûts**, les **délais**, l'**avancement des livrables** ainsi que les **écarts par rapport à la planification**. La navigation a été structurée pour faciliter l'exploration par type de projet, région, pays, identifiant projet ou phase.

1. Structure générale du dashboard

Page 1 – Vue globale

1.1 Cartographie des projets

La carte présente l'ensemble des projets localisés par pays. Chaque projet est représenté par une bulle dont la couleur indique le niveau de retard observé :

- **Vert** : conforme ou retard inférieur à 10 %
- **Jaune** : retard compris entre 10 % et 15 %
- **Rouge** : retard supérieur à 15 %

Cette visualisation permet d'identifier rapidement les zones géographiques présentant des retards.

1.2 Statut global des projets (graphique en anneau)

Le graphique synthétise le nombre de projets par statut :

- **Conforme** : avance ou retard ≤ 10 %
- **À surveiller** : écart entre 10 % et 15 %
- **En alerte** : écart ≥ 15 %

Ce visuel offre une vision immédiate sur le portefeuille global.

1.3 Tableau récapitulatif

Le tableau liste les projets selon trois informations :

- Pays
- Identifiant projet
- Statut (Conforme / À surveiller / En alerte)

1.4 Indicateurs de performance

a. Coûts actuels vs coûts planifiés

ESN DATA





Type de projet

Tout

▼

Region

Tout

▼

Pays

Tout

▼

Project ID

Tout

▼

Phase

Tout

▼

Date de début

01/01/2018

13/02/2022




Date de fin prévue

30/01/2018


19/08/2022



Cartographie des projets - Respect des deadlines

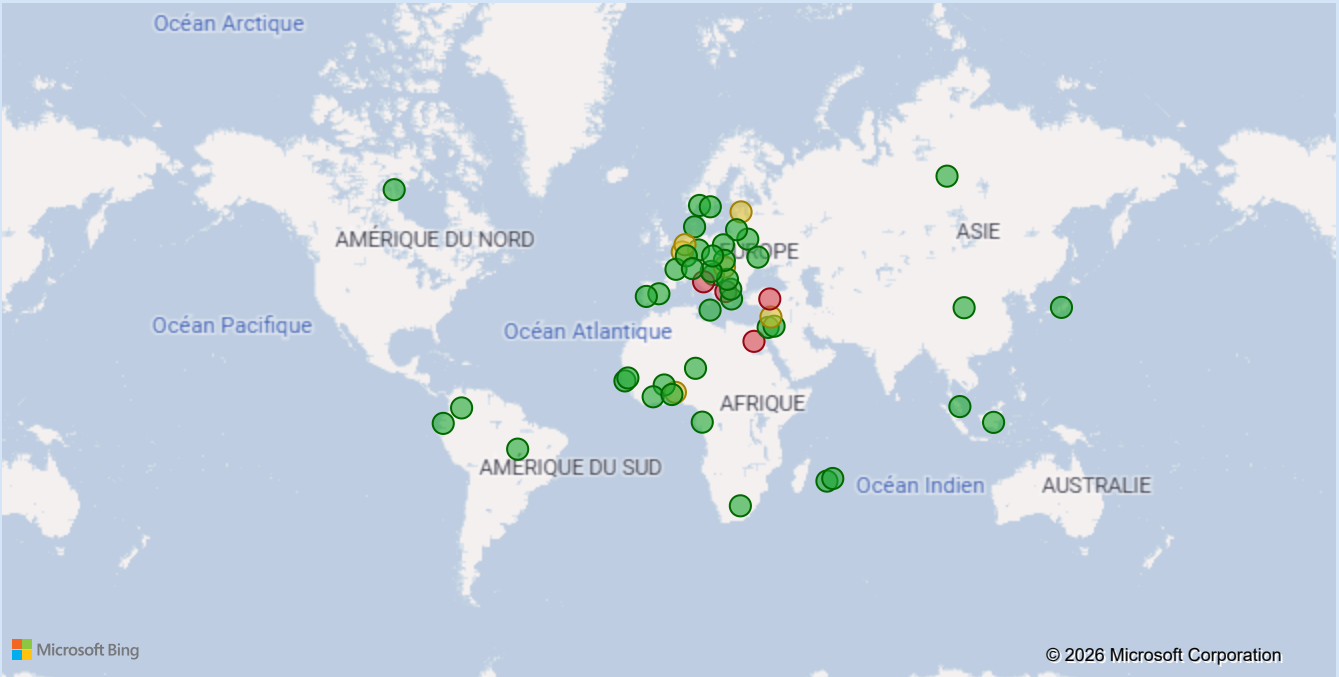


Statuts des projets

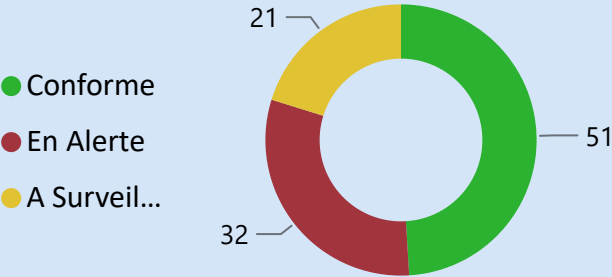

Pays	Project ID	Statut
Ukraine	24	Conforme
Ukraine	74	Conforme
Turquie	71	A Surveiller
Turquie	32	En Alerte


Suivi budgétaire

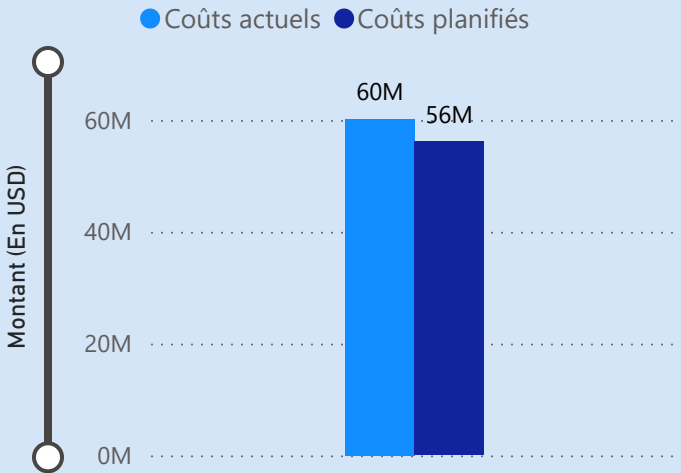

Ecart coût (en %)

7 %


Livrables produits

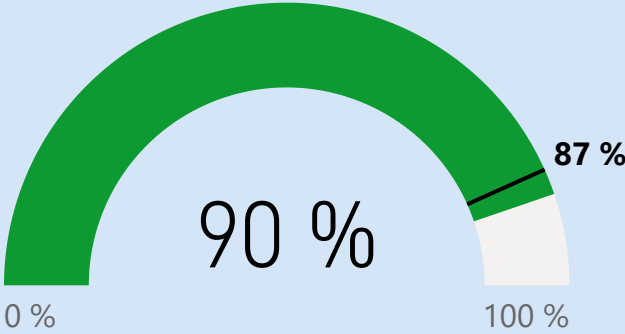

Ecart théorique (Nombre de livrable(s))

257 livrable(s) en avance

Deadlines

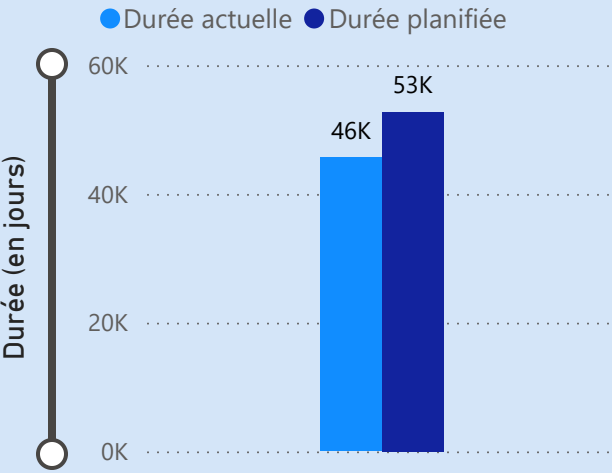

Ecart durée

7 081 jour(s) restant(s)



Project ID

- Sélectionner tout
- 99


Phase

- Sélectionner tout
- Phase A - Initiation
- Phase B - Preparation
- Phase C - Developme...


Planning

^ Tout réduire

99

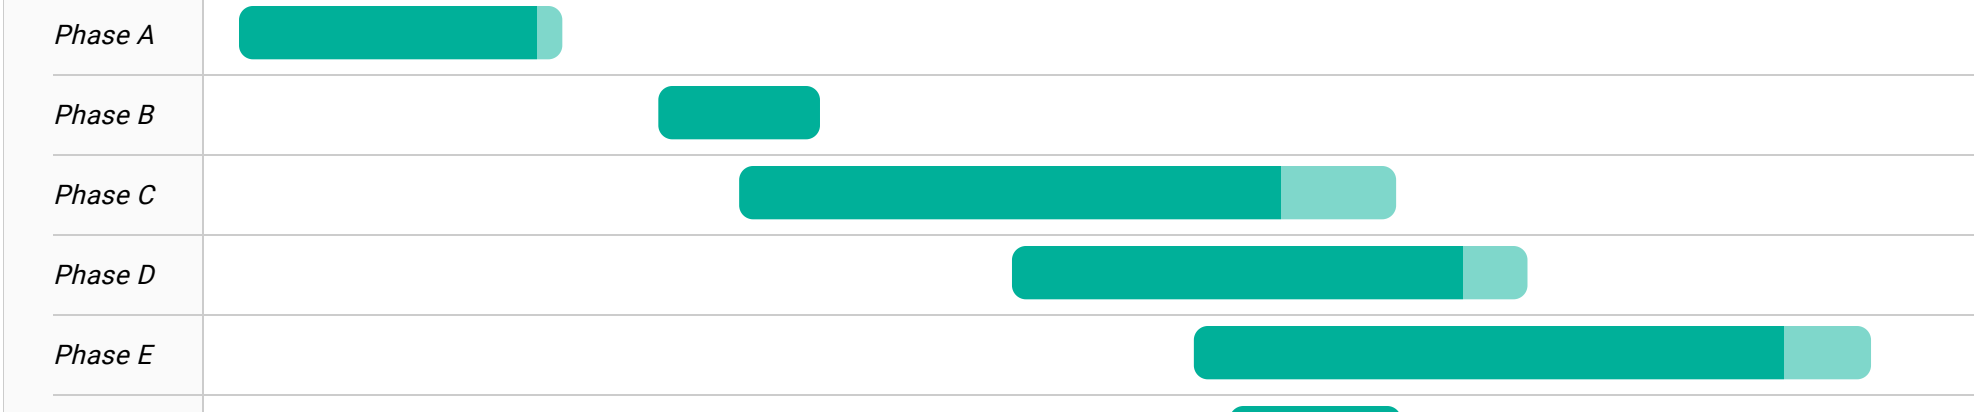


Suivi budgétaire

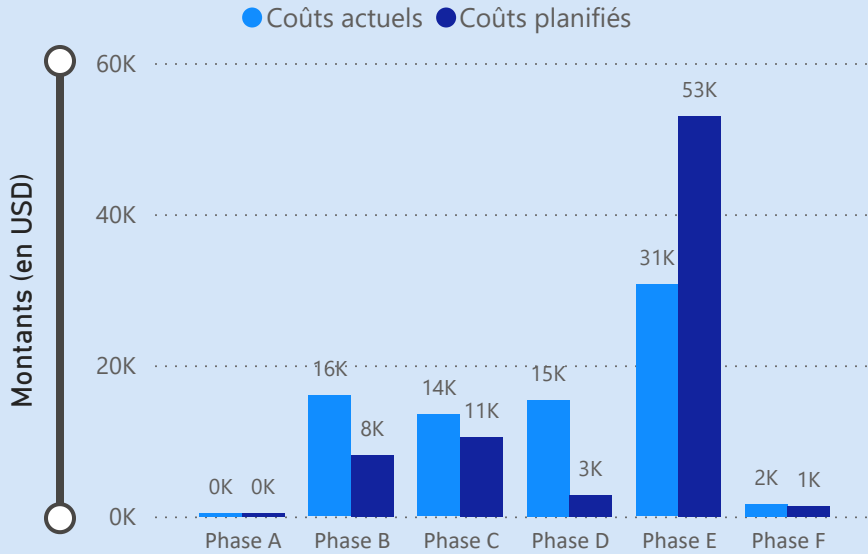

Ecart coût (en %)

2 %


Livrables produits

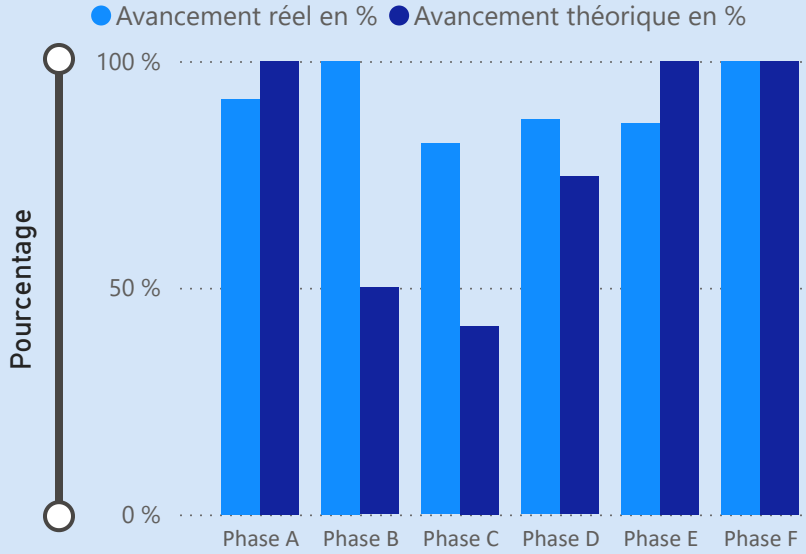

Nombre de livrables en avances / retards

3 livrable(s) en avance

Deadlines

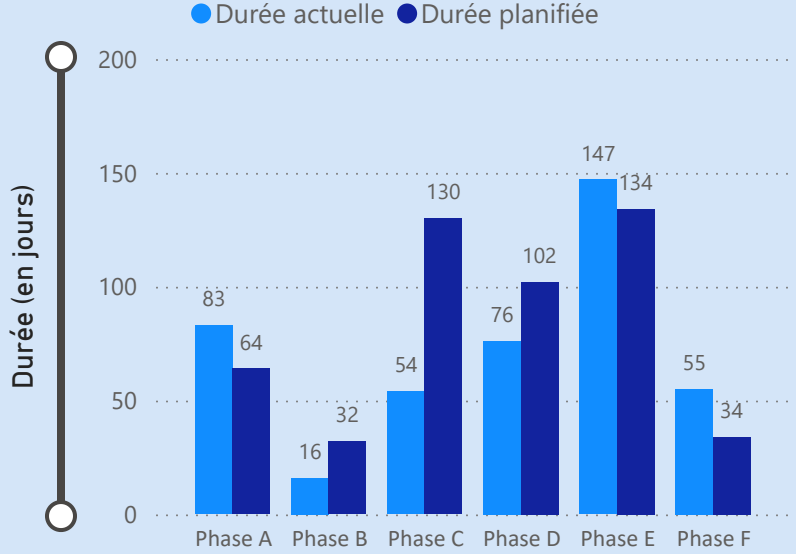

Avance / Retard

65 jour(s) restant(s)

Recommandations stratégiques :

- Réexaminer la **Phase D (Projet IT)** , fortement sujette aux surcoûts.
- Analyser les projets **en avance mais trop coûteux** pour réaligner ressources et budget.
- Améliorer la **granularité des données de livrables** pour un pilotage plus précis et fiable.
